



आ.व.०८१/८२ को अर्ध वार्षिक प्रगति- २०८१

1

प्रस्तुतकर्ता:

नि.डि.प्र. भेष राज भुसाल
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन
कार्यालय
अर्घाखाँची

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार



प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति विवरण
- हाल सम्मको (अर्ध वार्षिक) प्रगति सारांश
- आ.व.२०८१।८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति सारांश
- आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था
- व.उ.शी.नं. अनुसारको प्रगति विवरण
- खुद परिमाणात्मक उपलब्धि विवरण
- कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनाहरूको विवरण
- बेरुजु सम्बन्धी विवरण
- कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या तथा समाधानका उपायहरू
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	७	-	७	४	३	
२	प्रशासनिक	४	१	५	५	-	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कूल	११	१	१२	९	३	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	१	-	१	-	-	१	
२	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	अधिकृत सातौं/आठौं	२	-	२	१	-	१	
३	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
५	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	स.पाँचौं/अ.छैटौं	३	-	३	२	-	१	
६	ए.ओ.				स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
७	ह.स.चा.					-	१	१	-	१	-	
८	का.स.					२	-	२	१	१	-	
	जम्मा					११	-	१२	७	२	३	

हाल सम्मको (अर्ध वार्षिक) प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	हालसम्मको खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	१०१७८.००	३९४१.०९१	३८.७२ %	
२	पूँजीगत	४००.००	२५८.००९	६४.५० %	
३	पूँजीगत	१६७५००.००	१६८४७.०७६	१०.०५ %	
	कूल जम्मा	१७८०७८.००	२१०४६.१७६	११.८१ %	

आ.व.२०८१।८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति सारांश

क्र.सं	बजेट शिर्षक	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	२४३८.००	२०६६.७६२	८४.७७ %	
२	पूँजीगत	४००.००	२५८.००९	६४.५० %	
३	पूँजीगत	७०३५०.००	७१६१.७२	१०.८२ %	
	कूल जम्मा	७३१८८.००	९४८६.४९	१२.९६ %	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सिंचाइ)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)						कैफियत
		कूल आयोजना संख्या	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	खरिद प्रक्रियामा जान बाँकी	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	समानिकरण							
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ	२५	४	१८	१	३	०	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	७५	२०	४७	६	२	६	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	२३	३	१५	६	४	१	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण	३	२	१	०	०	०	
	समानिकरण जम्मा	१२६	२९	८१	१३	९	७	

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरूको संख्या	>८०% प्रगति भएको संख्या	५०-८०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	२५	३	१	२१	०
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	७५	१३	७	४९	६
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	२३	६	२	१४	१
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण	३	०	०	३	०
	समानिकरण जम्मा	१२६	२२	१०	८७	७

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	१२६	१६७५००.००	१६८४७.०७६	२७ %	१०.०५ %	११९	११३	
	जम्मा								

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (सिंचाइ)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	खर्च	प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	६०,५००.००	११८२६.८५४	४६	१९.५४ %	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	७,७५००.००	२१०३.७६२	१८	२.७१ %	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	२,७०००.००	२९१६.४६०	२८	१०.८० %	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण	२,५००.००	०	१६	० %	
	समानिकरण जम्मा	१७८०७८.००	१६८४७.०७६	२७ %	१०.०५ %	

मुख्य-मुख्य आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	कार्यक्रमको नाम					
१	दमाइढुङ्गा सिंचाइ योजना शितगगां - ४	८०००.००	१९००.०३९	८८%	२३.७५ %	ठेक्का सम्पन्न
२	हर्सिङ्गखोर सिंचाइ योजना सन्धिखर्क-१०	७०००.००	६४०४.६०९	७० %	९९.४९ %	
३	भाविनकाफेली सिंचाइ योजना शितगगां - ४ र ५	६५००.००	२१०९.६६५	७५ %	३२.४५ %	
४	जौंबारी चङ्खेली एकलेखेत सिंचाइ योजना शितगगां - २	७५००.००	०	५० %	० %	

कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	वार्षिक विनियोजन	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
१	पवराटार सिंचाइ योजना शितगगां १४	५००.००	योजनाको लागत ७ करोड ३५ लाख भएको र योजनामा अति न्यून बजेट विनियोजन ।
२	तिजुखोला सिंचाइ योजना भूमिकास्थान ४	१०००.००	खानेपानीको योजना ।
३	आपखोला चिसाटा बेल्टारी सिख सिंचाइ योजना स न पा ट	१०००.००	सडकको योजना ।
४	पाङ्ग्रेघाट सिंचाइ योजना शितगगां ५, अर्घाखाँची	८००.००	विबाद रहेको ।
५	पाखापानी सिंचाइ योजना मालारानी ३, अर्घाखाँची	८००.००	उपलब्धीमुलक नभएको
६	वल्गाका पाटा सिंचाई आयोजना पाणिनी १, अर्घाखाँची	१०००.००	उपलब्धीमुलक नभएको
७	तल्ला बेड्दी बगर बाँगिखोला तटबन्ध निर्माण पाणिनी-८ अर्घाखाँची	१०००.००	उपलब्धीमुलक नभएको

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/मुहान	पक्की नहर/कुलो	लिफ्ट सिंचाइ	सिंचाइ पोखरी	पम्प हाउस	पाइप लाइनिङ	बिद्युति करण	थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको
क	समानिकरण	वटा	कि.मी.	वटा	वटा	वटा	कि.मी.	वटा	हे.	हे.	कि.मी.	हे.	घर हे.
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	१	०.९०	-	-	-	-	-	४	-	-	-	-
२	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	-	२.१०	-	-	-	-	-	०	१०	-	-	-
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०.२१	०.५०	१३ ९
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम				०		-	-	-	-	-	-	-
	समानिकरण जम्मा	१	३.००	-	०		०		४	१०	०.२१	०.५०	१३ ९

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु.हजारमा

14

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	०	०	०	
२	नियमित गर्नु पर्ने	६३६.१०	०	०%	द्वन्द्वका कारण श्रेस्ता नष्ट भइ लेखा परिक्षण हुन नसकेको, मिनाहाको लागि केन्द्रिय तहशिल कार्यालयमा पत्राचार गरिएको
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	६३६.१०	०	०%	

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

15

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०८०/८१सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	२३२.०८४	२३२.०८४	१०० %	रकम रु ५७४.५३४ को प्रमाण पेश गरि फछ्यौटको क्रममा रहेको ।
२	नियमित गर्नु पर्ने	४४२६.८८४	५०.७३५	१.१४ %(१४.१२)	
३	पेशकी	०	०	०	
	कूल जम्मा	४६५८.९६८	२८२.८१९	६.०७%	

सन्चित कोषमा रकम कमी भइ भुक्तानी हुन नसकेको रकमको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	ठेक्का नम्बर	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायिको नाम	भुक्तानी हुन नसकेको रकम
१	WIDDARG/HKIP/NCB - 11/80-81	हर्सिङ्गखोर सिंचाइ योजना सन्धिखर्क १०, अर्घाखाँची	पौडेल कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्क १, अर्घाखाँची	५०३७.८९०
२	WIDDARG/BKIP/NCB- 06/080-81	भाविन कफेली सिंचाइ योजना शितगंगा ४ र ५, अर्घाखाँची	रिखादेवी कन्स्ट्रक्सन लमही १, दाङ	२१०१.२३९
३	WIDDARG/SBIP/NCB- 03/080-81	श्रीवाड (बरबाड) सिंचाइ योजना भूमिकास्थान ५ , अर्घाखाँची	पाण्डे कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्क १, अर्घाखाँची	२६७३.१३०
४	WIDDARG/BKRTW/ NCB-13/080-81	सन्धिखर्क चुत्रावेसी बजार संरक्षण कार्य सन्धिखर्क १ र २, अर्घाखाँची	दिप दर्शन कन्स्ट्रक्सन सैनामैना १, रुपन्देही	२१७९.२७८
५	QT	जलुके-आटरी-किर्लुक सिंचाइ सितगंगा-१, अर्घाखाँची	डि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्क १, अर्घाखाँची	२४१.५२९
६	QT	सधिखर्क-चुत्रावेसी स्थित बागीखोला-दिभद्रीखोला-घोचेखोला तटबन्धन	पौडेल कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्क १, अर्घाखाँची	६९५.५७७
७	QT	अफिस मर्मत कार्य (कन्टिन्जेन्सीबाट)	एन एस सन्धि कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	८०८.०८६
८	DPR	लदाम तल्लो कुलो र डोहोटे सिंचाइ योजनाको अध्ययन	स्पेश इन्जिनियरिङ्ग सर्भिसिस् प्रा लि काठमाडौं	४९४.९४०
९	DPR	विरोटा टुनिचौर र सेरा सिंचाइ योजनाको अध्ययन	वाइडरेन्ज इन्जिनियरिङ्ग सोलुसन प्रा लि काठमाडौं	४८५.९००
			जम्मा	१४७१७.५६९

क्रियाकलापमा नभएको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम : रु. ५०९३.९३७



कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या तथा समाधानका उपायहरू

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	सडक पूर्वाधारको अव्यवस्थित निर्माणले गर्दा सिंचाइ कुलोमा अत्यधिक क्षति पुग्ने गरेको ।		सडक निर्माण गर्दा क्षतिहुने सिंचाइ योजनामा सोही निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नितिगतरूपमै व्यवस्था गर्नु पर्ने ।



आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
२	नदिजन्य पदार्थको अब्यवस्थित उत्खलन ।।।।		स्थानियतहहरुले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खलन तथा अनुगमन लाई कडाइ गर्नु पर्ने ।।।।



आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
३	अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र त्यस पछाडी हुने जलउत्पन्न प्रकोप । । । ।		व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको निर्माण । । । । ।
४			

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
४	अविरल वर्षाको कारण योजनामा भएको क्षति । । ।	 <p>The collage consists of three photographs. The top-left photo shows a river with a concrete structure on the bank that has been partially washed away by the water. The top-right photo shows a river with a rocky bank and some vegetation. The bottom photo shows a group of people, including a woman in a pink shawl, standing on a concrete structure that appears to be a dam or a bridge, looking at the river.</p>	बजेट व्यवस्थापन गरी योजना संचालन गर्नु पर्ने ।

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
४	अविरल वर्षाको कारण भएको क्षति।।।।		बजेट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने ।



आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) को लागि रुपन्देही र कपिल्वस्तु स्थित सडक कार्यालय र निजी प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकोले निकै कठिनाई भएको ।		कार्यालयमै आवश्यक जनशक्ति सहित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२	सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको माग अत्यधिक रहेकोमा कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको ।		सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयमै एकमुष्ट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३	जिल्ला बाहिर बढ्दो बसाईसराइ, युवापुस्ताको विदेश मोह आदी कारणले गर्दा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँजो रहेनु साथै जनशक्तिको कमी ।		सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाट समस्याको समधान गर्नु हुन ।
४	कृषकहरुमा मेरो खेतमा पानी जाओस् तर मैले केही योगदान गर्न नपरोस् भन्ने भावनाको विकास भएको देखिन्छ ।		Motivation गर्नु पर्ने ।
६	जिल्लाको सिंचाइ गूरुयोजना निर्माणमा अलमल		सबै जिल्लाले समन्वय गर्नु पर्ने



कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरू (Good Practices)

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
अर्घाखाँची

सुनुनु हाम्रो बोधो व नगरीक बजार व इतिहास व सम्पदा

कोषाचर र सिचिबन्दी पढाउनु आह्वान सम्बन्धि सूचना ।। वन डिभिजन बर्लिया बडा अ. व. ०८१ (८२ मा बर्लियावन हुने वीकनटको स्थितिवाटगत विवरण ।।। सिंचाइ जल उपभोक्ता संसदहरूलाई भुत्तु ।।।

ई.भी.राज भुसाल
प्रिभिस डिभिजन प्रमुख

रामजी भुट्टाई
ए.ओ. अतिरिक्त (सूचना अधिकारी)

पदाधिकारी / कर्मचारी

सूचना अधिकारी

ई.भी.राज भुसाल
प्रिभिस डिभिजन प्रमुख
bhusal.br90@gmail.com

माधव भुसाल
जल स्रोत
माधव भुसाल
madhabbhusal1225@gmail.com

सिद्धी राना
कार्यालय
anjanranal100@gmail.com

प्राक्मणि विष्ट
अतिरिक्त (सूचना अधिकारी)
prakhmani100@gmail.com


रामजी भुट्टाई
ए.ओ. अतिरिक्त (सूचना अधिकारी)
arghakhanchi.100@gmail.com

कार्यालयको प्रोफाइल
आ.व.: २०८०/०८१

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
अर्घाखाँची
२०८१ आषाढ

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व.: २०८०/०८१



प्रकाशक:

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
अर्घाखाँची
२०८१ आषाढ

वेबसाइट निर्माण तथा अपडेट
widdarg.lumbini.gov.np

आ. व. ०८०।८१ को कार्यालयको प्रोफाइल तयार (प्रदेश स्थापना पछीको गतिविधिलाइ समेटिएको)

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरू (Good Practices)



जिल्लास्तरमा कार्यालयको वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

आ. व. ०८०।८१ मा यस कार्यालय अन्तर्गत निर्माण कार्यको म्याद अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायिलाइ सम्मान)

जिल्लाको सिंचाइको अवस्था

26

जिल्लाको कुल क्षेत्रफल : ११९३०० हेक्टर

खेति योग्य जमिन : ४५७१२ हेक्टर

खेति गरिएको जमिन : २८६०९ हेक्टर


खेत : ८४४४ हेक्टर

पाखो : २०१६५ हेक्टर


बाह्रै महिना सिंचाइ हुने : ३०८१ हेक्टर

मौसमी सिंचाइ हुने : ५३६३ हेक्टर

नदी तथा खोला : ३५३ गोटा

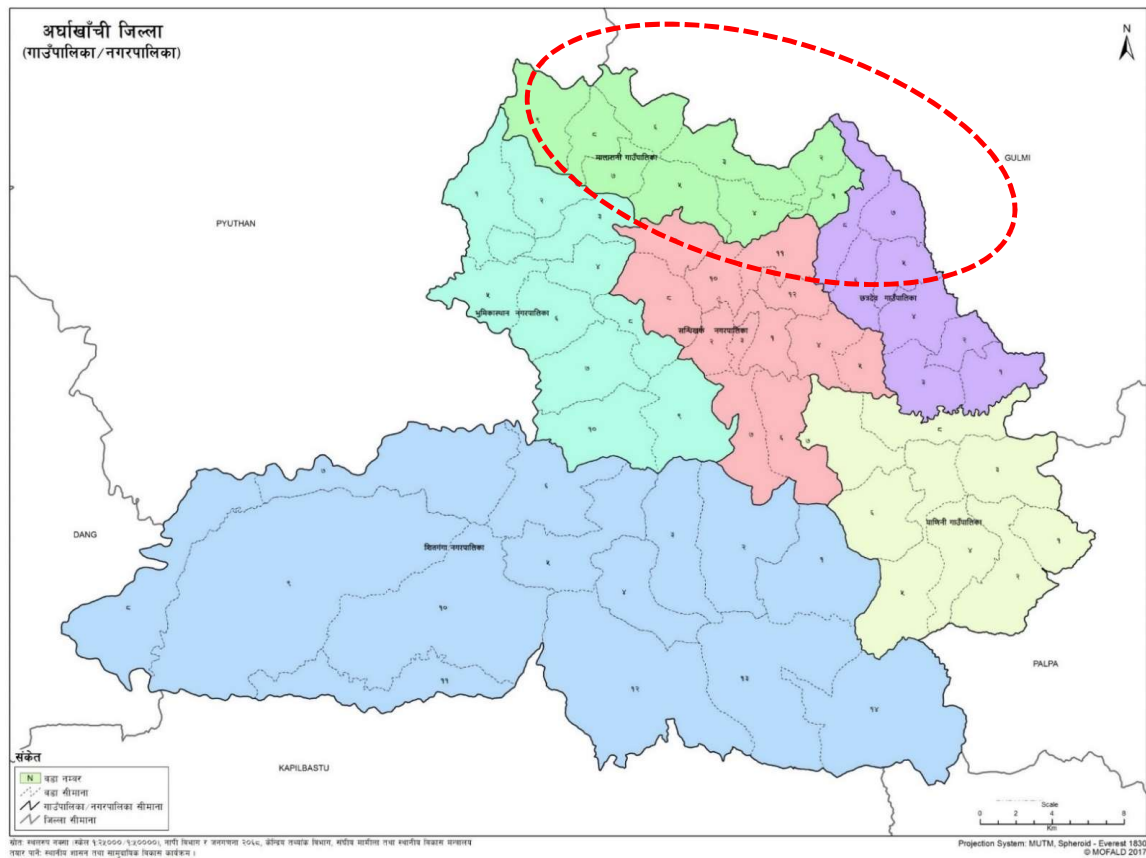

प्रदेश स्थापना पश्चात कार्यालयको विनियोजन बजेट र खर्चको अवस्था

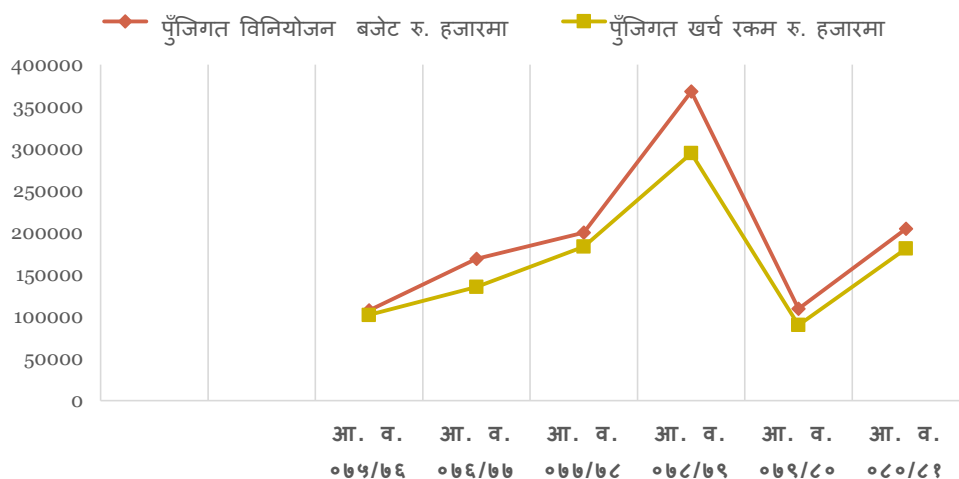

आ व	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ संरचन सुध्रिढीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)
०७७/७८	५३	२९३
०७८/७९	१४८	२२५
०७९/८०	८५	३७५
०८०/८१	१५	१७१
जम्मा	३०१	१०६४

सि. न.	आर्थिक वर्ष	पुँजिगत विनियोजन बजेट रु. हजारमा	पुँजिगत खर्च रकम रु. हजारमा
१	आ. व. ०७५/७६	१०७५००.००	१०१८३६.००
२	आ. व. ०७६/७७	१६८८०३.००	१३५०६७.००
३	आ. व. ०७७/७८	१९९९००.००	१८३२१२.३३
४	आ. व. ०७८/७९	३६८२००.८६	२९४५३५.५२
५	आ. व. ०७९/८०	१०९३४५.८६	८९८५५.४६
६	आ. व. ०८०/८१	२०४,५२५.००	१८०९५०.०४
	जम्मा	१११५८२७४.७२	९८,५४५६.३५

आ. व. ०८१/८२ : १६,७५००

केही स्थलगत फोटोहरू


आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

29



भाविन काफेली सिंचाइ योजनाको निर्माणाधिन **CORE WALL** शितगगां ४ र ५ , अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

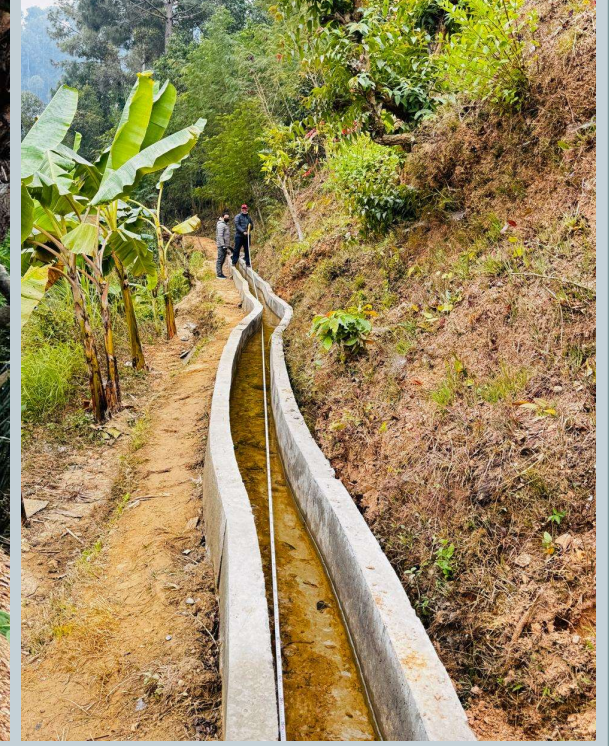

माउन्न चिबेक सिंचाइ योजना सन्धसखर्क द अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

31



झेडीखोला तटबन्ध कार्य सन्धिखर्क १ , अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

32



त्रिवेणी न्वार सिंचाइ योजना पाणिनी ३ अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु


33



त्रिवेणी न्वार सिंचाइ योजना पाणिनी ३ अर्घाखाँची



धारापानी खोला बेल्टारी सिंचाइ योजना सन्धिखर्क १० अर्घाखाँची

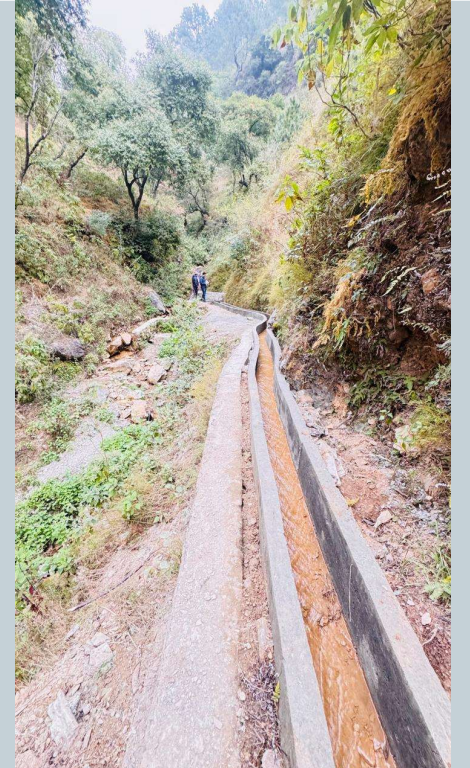

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

34



चिबेक तटबन्ध कार्य पाणिनी ५, अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

35



सुन्दुकी तटबन्ध कार्य पाणिनी ३, अर्घाखाँची

कुनै जिज्ञासा !
