



आ.व.०८९/८२ को
वार्षिक प्रगति - २०८२

1

प्रस्तुतकर्ता:

नि.डि.प्र. भेष राज भुसाल

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन

कार्यालय

अर्धाखाँची

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार



प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति विवरण
- वार्षिक प्रगति सारांश
- बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण
- निकासा रोक्काको कारण भूत्कानी नभएकायोजना विवरण
- वहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था
- खुद परिमाणात्मक उपलब्धि विवरण
- बेरुजु सम्बन्धी विवरण
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	७	-	७	४	३	
२	प्रशासनिक	४	१	५	५	-	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कुल	११	१	१२	९	३	

वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेटशिर्षक	वार्षिक विनियोजन	कूल खर्च	सुरु बजेटमा खर्च (%)	निकासारोक्ताले रोकिएका		कैफियत
					योजना सङ्ख्या	रकम	
१	चालु	१०१७८.००	८०६६.९४	७९.२६ %			ठेका लगाइ बचत रकम रु. १६६८७ समयमै समर्पणको लागि पठाइएको तर समर्पण नभएको । समर्पण भएको भए ९६.९९ % प्रगति हुने थियो
२	पूँजीगत	४००.००	३९३.३८३	९८.३५ %			
३	पूँजीगत	१६७५००.००	१४४९४५.८४	८६.५३ %	२	२१४३.२३	
	कूल जम्मा	१७,८०,७८.००	१५,३४,०६.९६१	८६.९५ %	२	२१४३.२३	

बजेटको स्रोत अनुसार वार्षिक प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कार्यान्वयन नभएकम आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)				
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	१३३	१६७५००	१४४९४५.८४	९७.९९	८६.५३	१२५	१२३	८	
	जम्मा									

निकासा रोककाको कारण भूत्तानी नभएका योजना(सिंचाइ)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम/योजनाको नाम	योजना सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	हाल सम्मको भूत्तानी	भूत्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम	आ.व. २०८२/८३ को विनियोजन	हालको अवस्था	कैफियत
क	समानिकरण ३०८०००१५४								
१	जौबारी चंखेली एकलेखेत सिंचाइ योजना शितगंगा न.पा-२, अर्धाखाँची	२०८०।११।२ ७	१००८४.९ ५९४२	२०८१।११ ।३०	८४११.५९८	१४८२.६२४	३५००	ठेकाको काम सम्पन्न	
२	जेरेखोला बगाले पाँचसयफाँट सिंचाइ योजना सन्धिखर्क ४ र छन्द्रेव ६, अर्धाखाँची	२०८१।१२।२ ७	८४१९.९० ७	२०८२।१२ ।३०	७७३९.९३७	६६०.६०८	१०००	ठेकाको काम सम्पन्न	
	कुल जम्मा		१८५०४. ८६६		१६१५१.५ ३५	२१४३.२३	४५००		

कार्यालयमा बहुवर्षिय योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्र	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	आ.व.२० द१/द२ विनियोजित रकम	आ.व.२०८ १/द२ को खर्च	हाल सम्मको खर्च	प्रगति (प्रतिशत)		यस आ.व.को लागि आवश्यक रकम	यस आ.व.को विनियोजित रकम	योजना सम्पन्न हुने वर्ष
								भौतिक	वित्तीय			
१	हर्सिङ्गखोर सिंचाइ योजना सन्धिखर्क-१० अर्धाखाँची	२०	३२८२८	१९०९०	१३५२७	१३५२३	१८४३०	८०	५६	१९००	१९००	८२/८२
२	जौबारी चड्डेली एकलेखेत सिंचाइ योजना शितगगां - २ अर्धाखाँची	२०	२४२७५	१२६६२	७५००	६०५३	९०५३	७८	३७	४२००	३५००	८२/८२
३	खयरभट्टी सि यो शिनपा ११	३०	२६०००	१३९८०	३०००	२७१८	२७१८	१५	१०	१२०००	१००००	८२/८२
४	रातटारि सि यो स न पा ६ अ खाँ	१९	१७६२९	९०३७	१६००	१५८३	१५८३	२०	८	७५००	७०००	८२/८२
५	जेरखोला बगाले साँचसयफाँट सि यो सनपा ४ र छत्रदेव ६ अ खाँ	३२	१७१५६	८४८२	८०००	७९९९	७९९९	८५	४६	२०००	१०००	८२/८२
कुल जम्मा										२७६००	२३४००	४२००

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/ मुहान	पक्की नहर/ कुलो	लिफट सिंचाइ	सिंचाइ पोखरी	पाइप लाइनिङ	थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	नदी नियन्त्रणबा ट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको	
		बटा	कि.मी.	बटा	बटा	कि.मी.	हे.	हे.	कि.मी.	हे.	घर	हे.
१	समानिकरण											
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ	५	७.४४	१	-	०.०३	१५	१५८	-	-	-	-
२	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	१	८.४३५	१	-	२.६२५	४	२३२	-	-	-	-
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	१.०१३	४.३५	३७	६१.५
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम				४	-	-	-	-	-	-	-
	समानिकरण जम्मा	६	१५.८७५	२	४	२.६५५	१९	३९०	१.०१३	४.३५	३७	६१.५

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रुहजारमा

९

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब. २०७४/७ ५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	०	०	०	
२	नियमित गर्नु पर्ने	६३६.१०	०	०%	द्वन्द्वका कारण श्रेस्ता नष्ट भइ लेखा परीक्षण हुन नसकेको, मिनाहाको लागि केन्द्रिय तैहशिल कार्यालयमा पत्राचार गरिएको
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	६३६.१०	०	०%	

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)


रुहजारमा

10

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०८०/८१सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	२३२.०८४	२३२.०८४	१०० %	रकम रु ५७४.५३४ को प्रमाण पेश गरि फछ्यौटको क्रममा रहेको ।
२	नियमित गर्नु पर्ने	४४२६.८८४	५०.७३५	१.१४ %(१४.१२)	
३	पेशकी	०	०	०	
	कूल जम्मा	४६५८.९६८	२८२.८१९	६.०७%	


केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

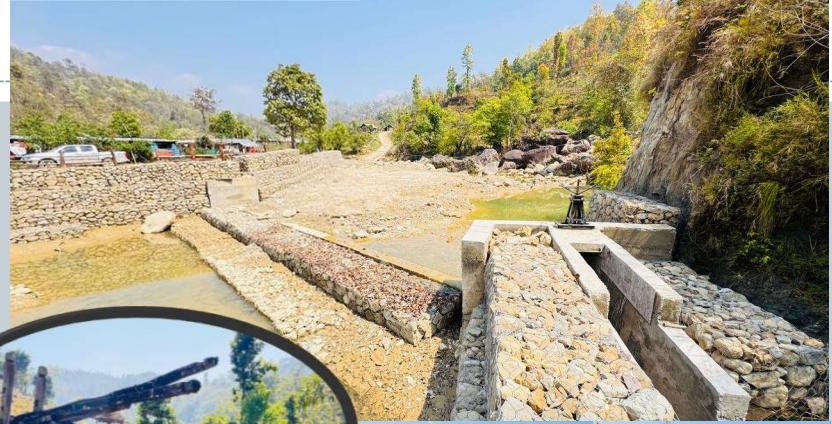

भाविन काफेली सिंचाइ योजनाको सम्पन्न भाविन System शितगगां ४ र ५ , अघाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

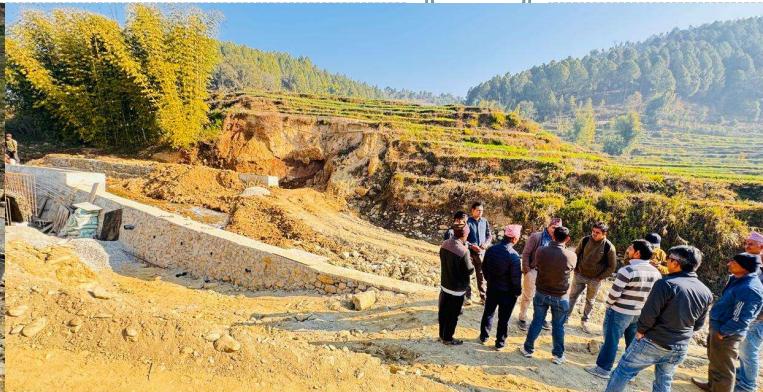

हाँसैङ्गखोर सेंचाइ योजना सान्धेखके १० अघांखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



जौबारी चंखेली एकलेखेत सिँचाइ योजना
शितगां २, अर्धाखाँची



आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



जरेखोला बगाले पाँचसयफाँट सिंचाइ योजना सन्धिखर्क ४ र छत्रदेव ६, अघाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू



टिक्री सिंचाइ योजना शितगगाँ ११, अर्घाखाँची

आम्बोट, ढाँड र पलुवा सिंचाइ योजना पाणिनी ३, अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



घोचेखोला हाइटेरी सिंचाइ योजना सन्धिखर्क १०



शेरा सिंचाइ योजना सन्धिखर्क ६ अर्घाखाँची



माझकुलो काफलटारी सिंचाइ योजना सन्धिखर्क २ र १० अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू



लापे लिफ्ट सिँचाइ योजना शितगगां द, अर्धाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू

19



सुन्दुकी तटबन्ध कार्य पाणिनी ३, अघाखाँची

चिबेक तटबन्ध कार्य पाणिनी ५, अघाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू

३०



शितखोला तटबन्ध कार्य शितगगां २, अर्धाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू

21



आरिचौर पोखरी निर्माण भूमिकास्थान १०, अर्घाखाँची



किमडाँडा पोखरी निर्माण सन्धिखर्क ८, अर्घाखाँची



लामापोखरा र देसान्तरी पोखरी संरक्षण कार्य सन्धिखर्क १०
, अर्घाखाँची

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू

22



जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखज्यू , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत बाट निर्माणाधिन
योजनाहरूको अनुगमन

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू



अर्धाखाँची जिल्लाका जल उपभोक्ता संस्थाहरुका सदस्यहरुलाई
संस्थागत विकास तालिम तथा अवलोकन भमण ।।



कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व.: २०८१/०८२



लुमिबनी प्रदेश सरकार
उज्जी, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
अध्यार्थी
२०८२ आषाढ

24

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व.: २०८१/०८२



प्रकाशक:

लुमिबनी प्रदेश सरकार
उज्जी, जलस्रोत तथा सिंचाइ गवालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
अध्यार्थी
२०८२ आषाढ



कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव!
